




MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL

INFORME N°33 – 2025 CONCEJO MUNICIPAL



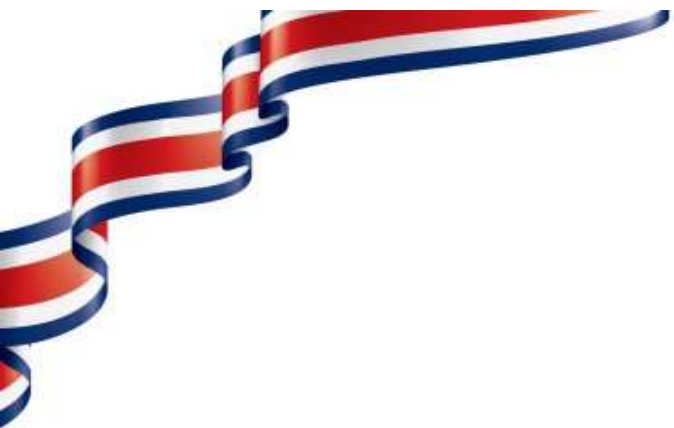

**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**


ACCIONES ADMINISTRATIVAS



PUENTE LA ISLA

❖ Aprobación del Presupuesto Extraordinario N°02 - 2025

RESUMEN DE APORTES ECONOMICOS		
DESCRIPCIÓN	% APOORTE	MONTO APOORTE
APORTE ECONOMICO MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA	42,69%	₡220 800 000,00
APORTE ECONOMICO CORBANA	57,31%	₡296 367 000,00
TOTAL PROYECTO SIN IVA		₡517 167 000,00

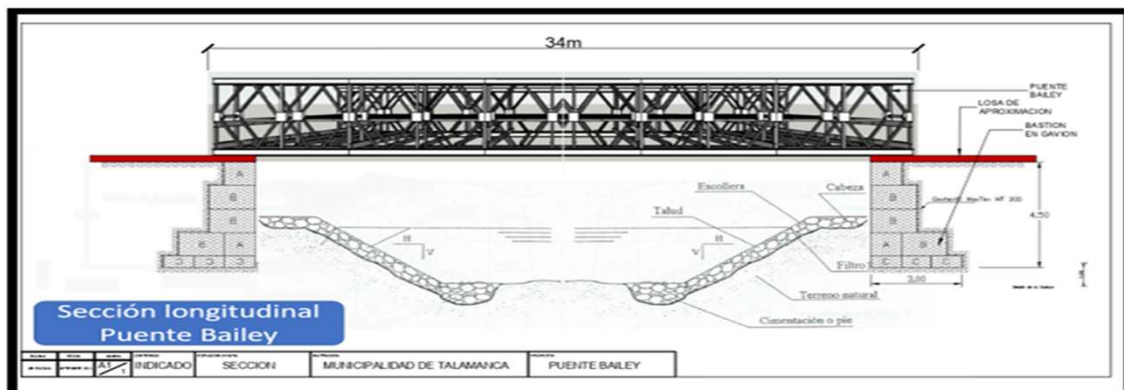

**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

- ❖ Diseño y construcción de puente Bailey de 34 metros sobre el canal Quebra Caño, en la comunidad de Las Parcelas-La Isla de Sixaola:
- ❖ Ruta cantonal C7-04-269
- ❖ Un carril de 4.20 m de ancho, sin paso peatonal
- ❖ Losas de aproximación, rellenos en lastre, bastiones en gavión y escollera de concreto
- ❖ Plazo total de ejecución: 240 días naturales (90 contratación +150 ejecución)
- ❖ Beneficiarios: comunidades locales y productores bananeros



SEGUIMIENTO DE PLANES MUNICIPALES




**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

- ❖ El lunes 01 de setiembre se realizó la primera mesa de trabajo con los Territorios Indígenas.
- ❖ Abordaje de la actualización de los Planes de Desarrollo Humano, Plan Estratégico y GIRS.
- ❖ Inicio de elaboración de proceso de mecanismo de consulta pública previa e informada.
- ❖ Se les entrega la matriz donde se encuentran los ejes estratégicos para el estudio previo
- ❖ Indicar los grupos focales para brindar los talleres



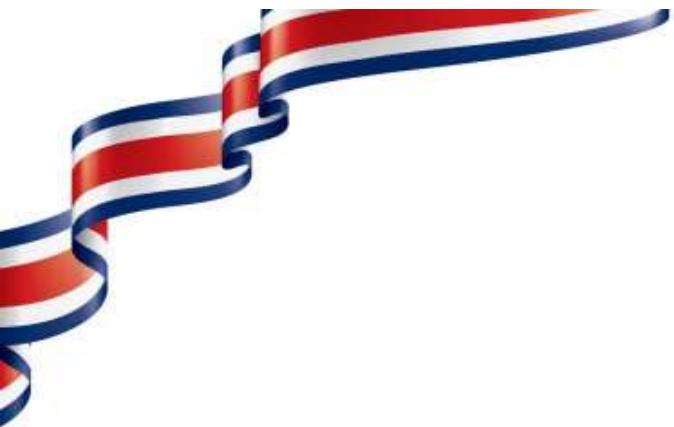

**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

AMBIENTAL




PROGRAMA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SITIOS PÚBLICOS





**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**


**GOBIERNO
LOCAL**

FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD
19/08/2025 22/08/2025 29/08/2025 04/09/2025	Bratsi – Parquécito y Aceras de Bribri	Chapia y Limpieza



Fecha	Lugar	Actividad
03/09/2025	Bratsi –Plaza de Suretka	Chapia y Limpieza

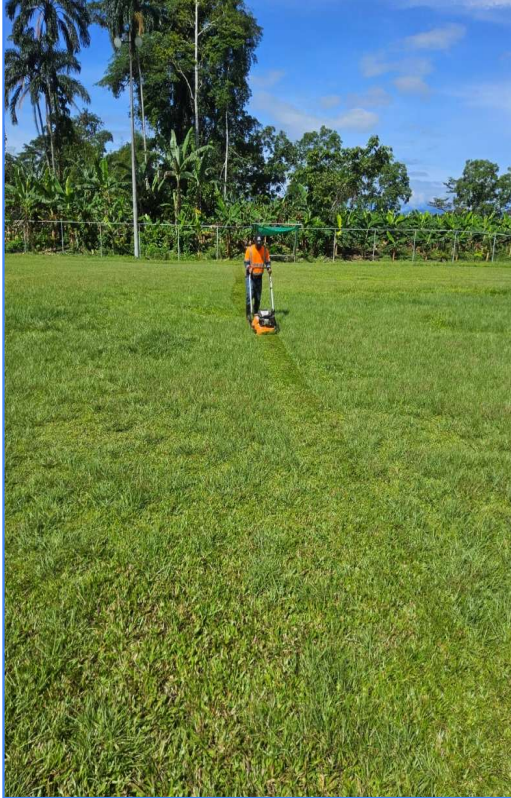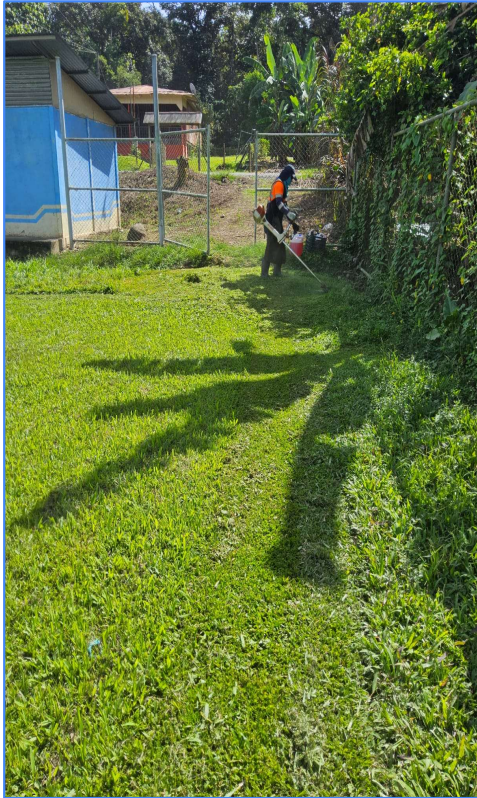

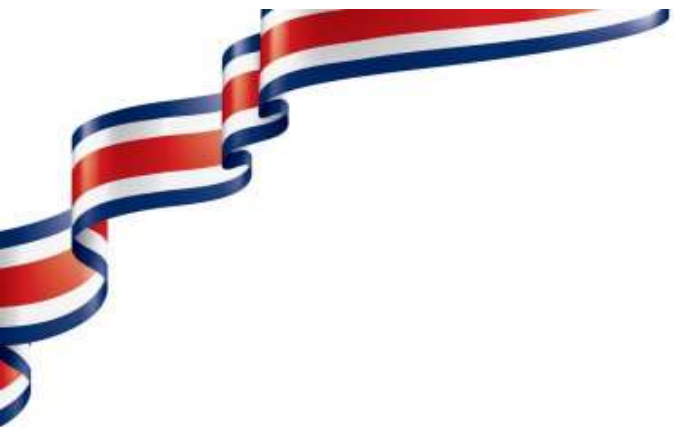

**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

INTERVENCIÓN VIAL




MANTENIMIENTO RUTINARIO




**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

CAMINO	KM	M Cubicos	ACCIONES	AVANCE
DISTRITO BRATSI 7-04-019 La Pera	2,7 Km	420 M³	✓ Limpieza de cunetas. ✓ Conformación de superficie de ruedo.	26%

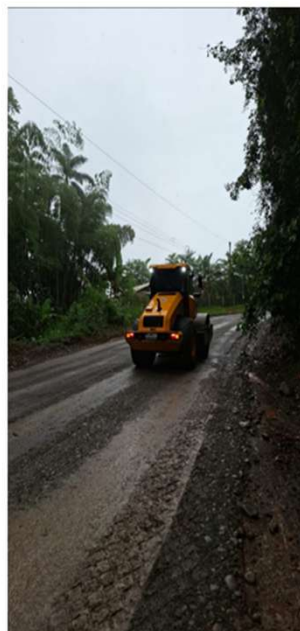

**COLOCACION DE LASTRE, NIVELACION,
COMPACTACION Y CONFORMACION DE
SUPERFICIE DE RUEDO**

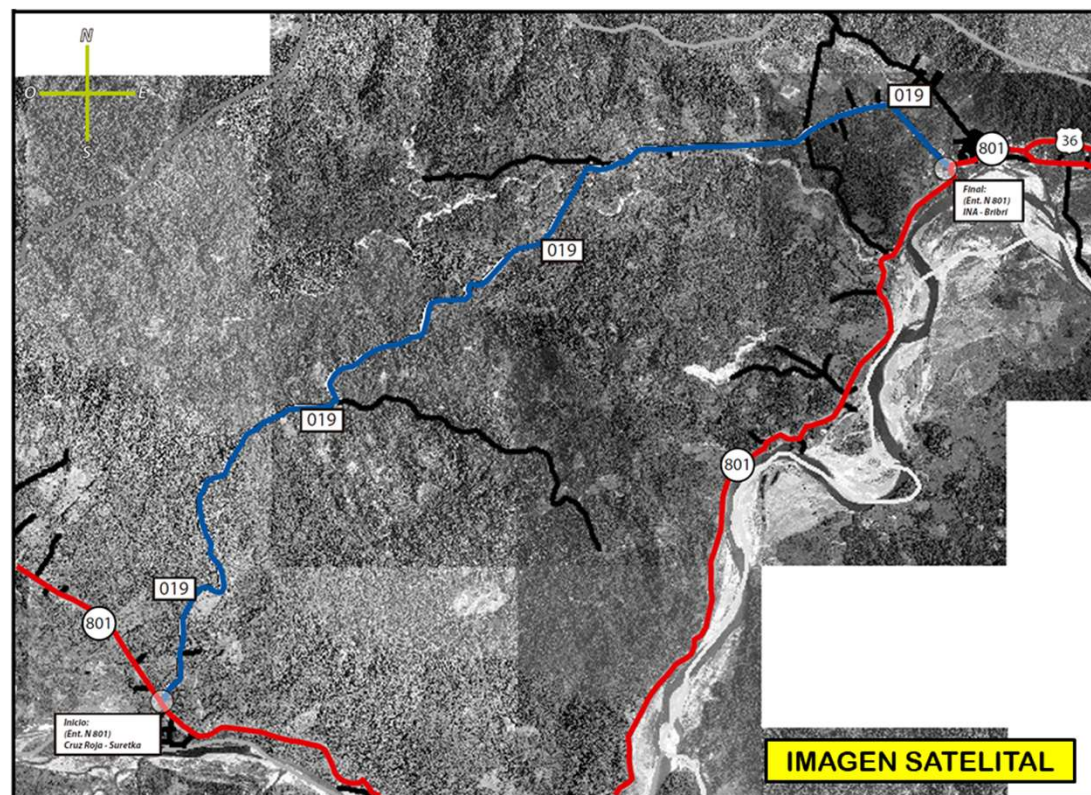


MANTENIMIENTO RUTINARIO



**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

CAMINO	KM	M Cubicos	ACCIONES	AVANCE
DISTRITO SIXAOLA 7-04-017 Paraíso – Punta Uva	7,25 Km	1020 M³	✓ Colocación de lastre. ✓ Nivelación y conformación de superficie de ruedo. ✓ Compactación de la superficie de ruedo.	80%

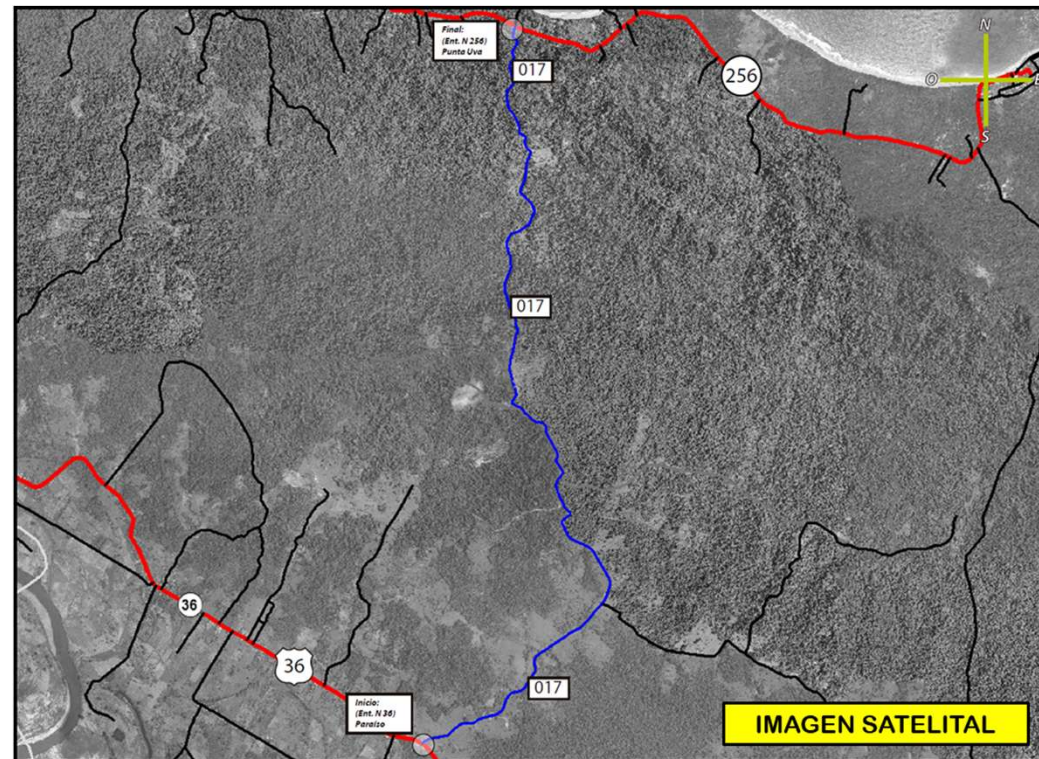

**COLOCACION DE LASTRE, NIVELACION,
COMPACTACION Y CONFORMACION DE SUPERFICIE
DE RUEDO**


MANTENIMIENTO RUTINARIO



**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

CAMINO	KM	M Cubicos	ACCIONES	AVANCE
DISTRITO SIXAOLA 7-04-042 CRUCE BASURERO MUNICIPAL	4,9 Km	720 M³	✓ Limpieza de cunetas. ✓ Conformación de superficie de ruedo.	100 %

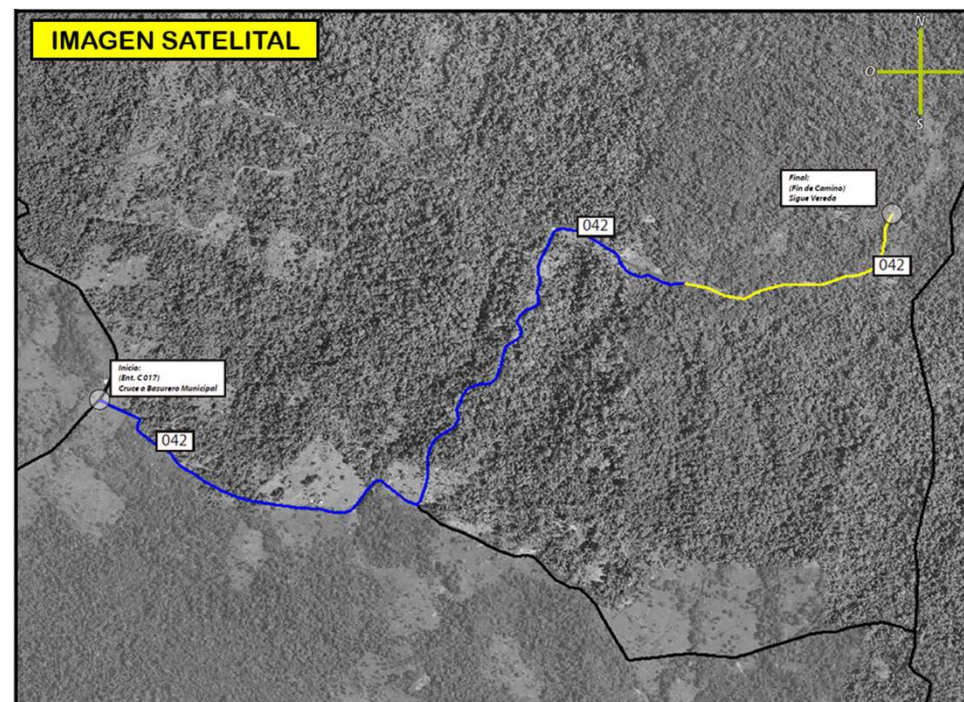

**COLOCACION DE LASTRE, NIVELACION,
COMPACTACION Y CONFORMACION DE
SUPERFICIE DE RUEDO**

PROYECTO PAVIMENTACIÓN TSB3



MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL

- ❖ Contratación por demanda para asfaltado en MAC y de mantenimiento de bacheo en caminos con TSB3 con aplicación final de fog seal, para los caminos en la red vial del cantón de Talamanca
- ❖ Se encuentra en la Oficina Legal para el estudio de Admisibilidad.



TSB3

Listado de solicitudes de verificación				
Número de procedimiento		Número de SICOP	20250803191 - 00 -	
Asunto				
Tipo de verificación	Todos ▾			
Rango de fechas de solicitud	~ (formato dd/mm/yyyy)			
10 resultados ▾				Consultar
				Mi página
Número de secuencia	Número de procedimiento	Asunto /Número de documento	Fecha/hora de solicitud	Número de verificadores /total
1756112	2025LD-000036-0022300001	Solicitud de criterio legal de admisibilidad de ofertas 2025LD-000036-0022300001 (0672025001000083)	03/09/2025 13:29	0 / 1

1 resultados [1 de 1 páginas]

PROYECTO COMPRA DE MAQUINARIA



**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE EMULSIÓN

- ❖ Próximo miércoles 10 de setiembre se estará haciendo entrega
- ❖ El proceso ha recibido una serie de apelaciones por parte de las empresas participantes, misma que se resuelven por parte de la contraloría.
- ❖ Actualmente el proceso se encuentra en departamento legal.



PROYECTO PARQUECITO Y BOULEVARD



MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL

DE BRIBRI

- ❖ Estado Actual: 85% de Avance
- ❖ AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD Y PARQUECITO DE BRIBRI
- ❖ Colocación de enzacatado en boulevard y parque.
- ❖ Pintura en bancas (pollitos)
- ❖ Colocación de Iluminación



PROYECTO MERCADO DE SIXAOLA



MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL


Avance del proyecto del 60%.

Se Trabaja:

- ❖ Estructura de techos (avance en acabado en pintura).
- ❖ Rampas y gradas de accesos
- ❖ Hoy se inicia con colado (chorrea) de pisos en locales.
- ❖ Trabajos de Electromecánica.
- ❖ Repello grueso, casi terminado.



TRABAJOS ACTUALES EN TECHOS, PISOS, GRADAS Y RAMPAS

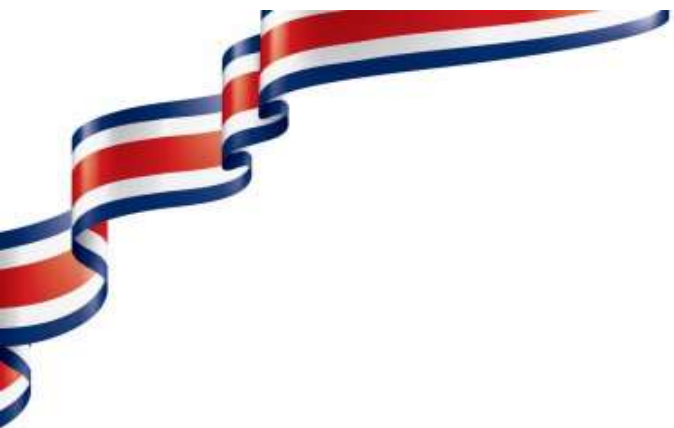

OTROS



**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

❖ **Modificación Interna N°09-2025**



EMBARCADERO DE PUERTO VIEJO



MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL

- ❖ Con respecto al Proyecto del Embarcadero de Puerto Viejo se han realizado **2 HOJAS DE RUTA**
- ❖ **HOJA DE RUTA N°01:** “Socialización y entrega de resumen del proyecto con el Concejo Municipal, Síndicos y Grupos Focales”.
- ❖ **No se aplicó por ausencia de JAPDEVA**
- ❖ **HOJA DE RUTA N°02:** “Convocatoria a la Socialización del Proyecto Embarcadero de Puerto Viejo al Concejo Municipal”.
- ❖ **No se ha Realizado**
- ❖ **CONCLUSIÓN**
- ❖ **No se ha Socializado**
- ❖ **No se ha realizado Firma de Convenio**
- ❖ **Las Publicaciones del Proyecto del Embarcadero de Puerto Viejo son Exclusivamente de JAPDEVA**

Diseño del embarcadero para Puerto Viejo de Talamanca, proyecto aprobado por la Junta Directiva de JAPDEVA, un sueño hecho realidad 🇳🇷 🌴 🏡
Esto no sería realidad sin el empeño del trabajo en equipo realizado por:

La División Marítima Portuaria del MOPT, Setena del MINAE, Secretaría Técnica de Mideplan y el equipo de la Unidad de Gestión de Proyectos de Japdeva. Equipos técnicos.

Sigamos avanzando y no dejemos de creer.

Presidencia de la República
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Instituto Costarricense de Turismo
SETENA-Secretaría Técnica Nacional Ambiental
Ministerio de Ambiente y Energía
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
JAPDEVA.Presidencia Ejecutiva.





**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

GRACIAS.!!

